


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成23年4月末現在）

1. 主要工程（平成23年2月変更時点の計画）

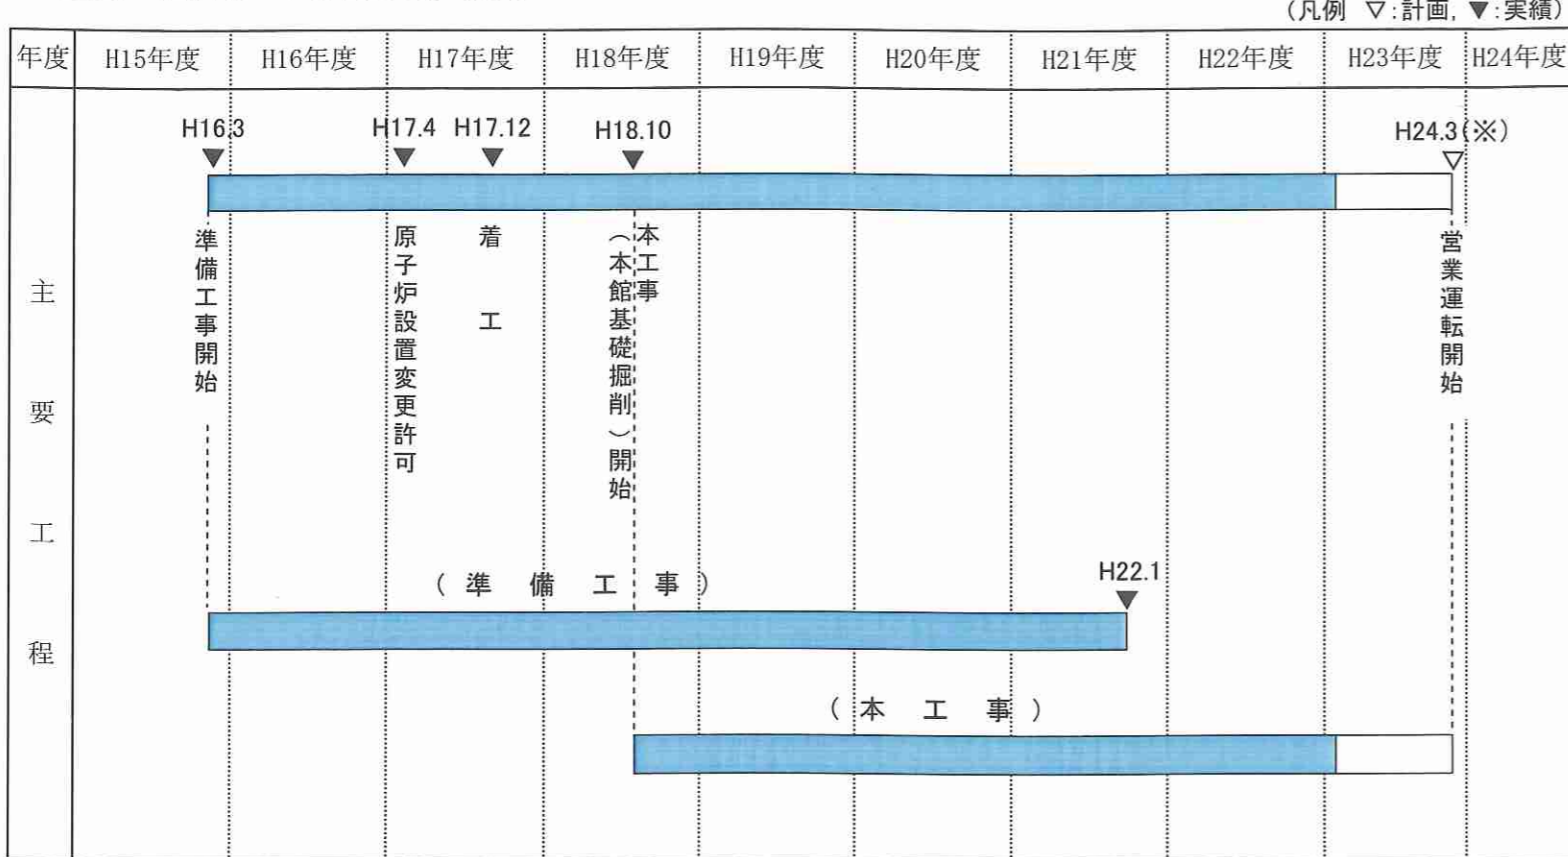

※ 東日本大震災に伴い、制御棒駆動機構を分解点検する工場が被災したことから、工程への影響について確認中。

4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- ・ 構内整備工事
構内道路・排水路他施工中

(2) 建築工事

- ・ 廃棄物処理建物仕上げ工事施工中

(3) 機械電気工事

- ・ FMCRD据付調整中
(工場持ち帰り中)


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
● 公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	● 第1回工事計画認可 (着工)	H17. 5. 31	H17. 12. 22
● 公有水面埋立竣工許可	-	H22. 1. 19	● 第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
● 林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	● 第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
● 原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	● 第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
● 電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	● 第5回工事計画認可	H20. 5. 30	H20. 12. 26
● 燃料設備使用承認	H22. 8. 5	H22. 8. 27	● 工事計画変更認可 (洗濯廃液処理装置)	H21. 7. 24	H21. 10. 14
			● 工事計画変更認可 (排ガス再結合器)	H21. 10. 15	H21. 11. 9

3. 工事進捗率

総工事進捗率：93.6%

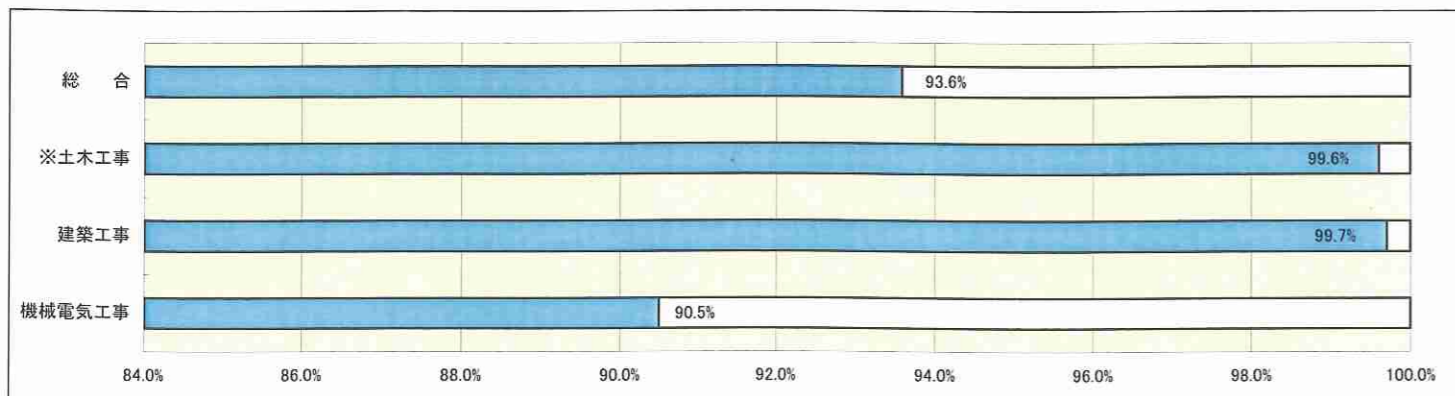

※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景
