


# 島根原子力発電所 3号機建設工事進捗状況 (平成25年9月末現在)

## 1. 主要工程

(凡例 ▽:計画, ▼:実績)

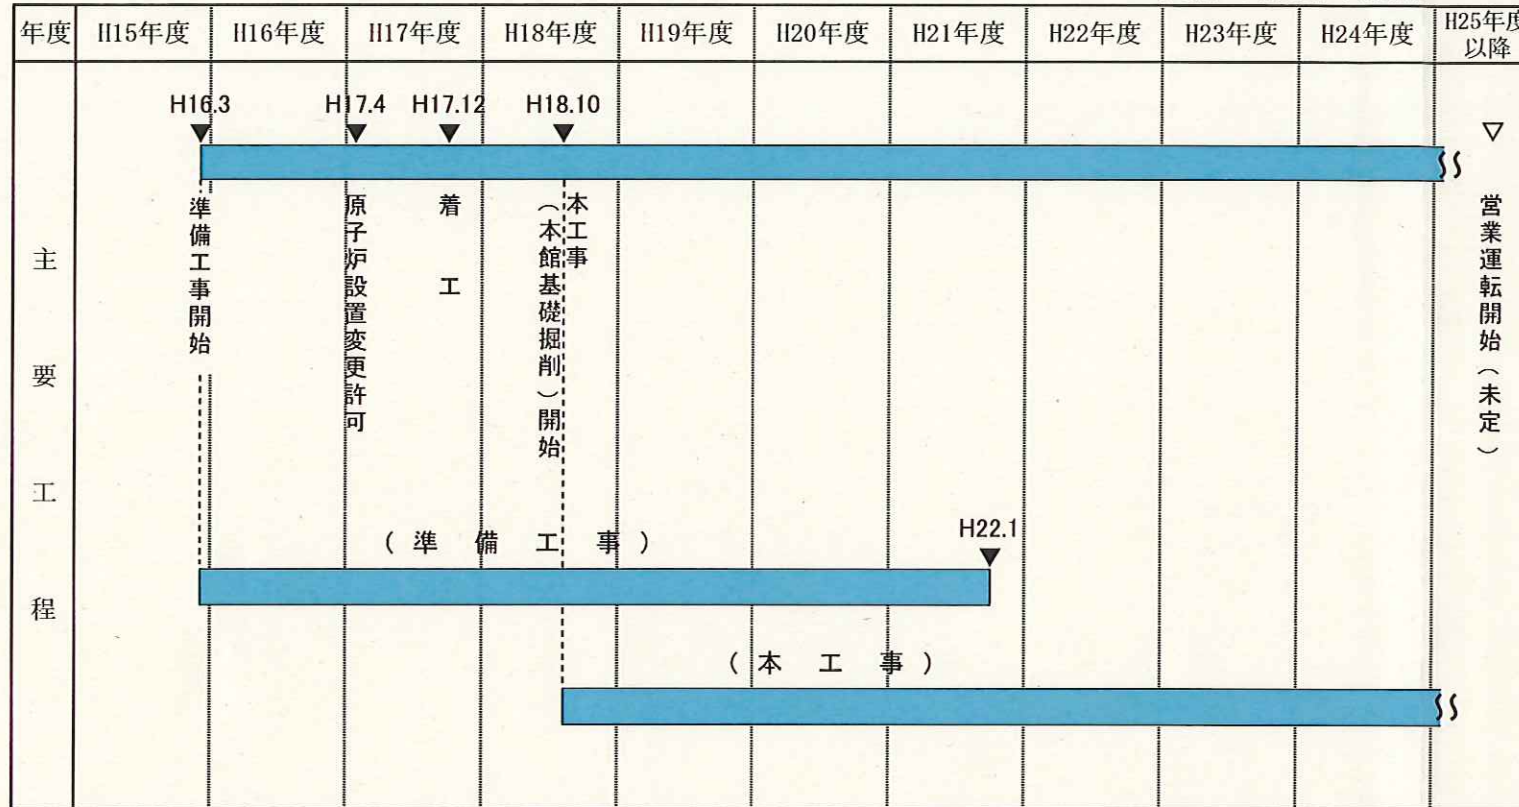

## 4. 建設工事概況

### (1) 土木工事

- ・パイプ付ベント設備設置工事
- ・取水口堰設置工事
- ・常設代替注水設備設置工事

### (2) 建築工事

- ・排気筒耐震裕度向上工事

### (3) 機械電気工事

## 2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)


項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可(着工)	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●公有水面埋立竣功許可	-	H22. 1. 19	●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	●第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	●第5回工事計画認可	H20. 5. 30	H20. 12. 26
●燃料設備使用承認	H22. 8. 5	H22. 8. 27	●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21. 7. 24	H21. 10. 14
			●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	H21. 10. 15	H21. 11. 9
			●工事計画軽微変更届出	H24. 1. 5	-
			●工事計画変更認可(排気筒)	H25. 5. 20	H25. 7. 1

## 3. 工事進捗率

総工事進捗率: --, --%

今後の建設工程が確定しないことから、進捗率については建設工程が確定した後お知らせします。

<参考:平成23年4月末時点の総工事進捗率:93.6%>

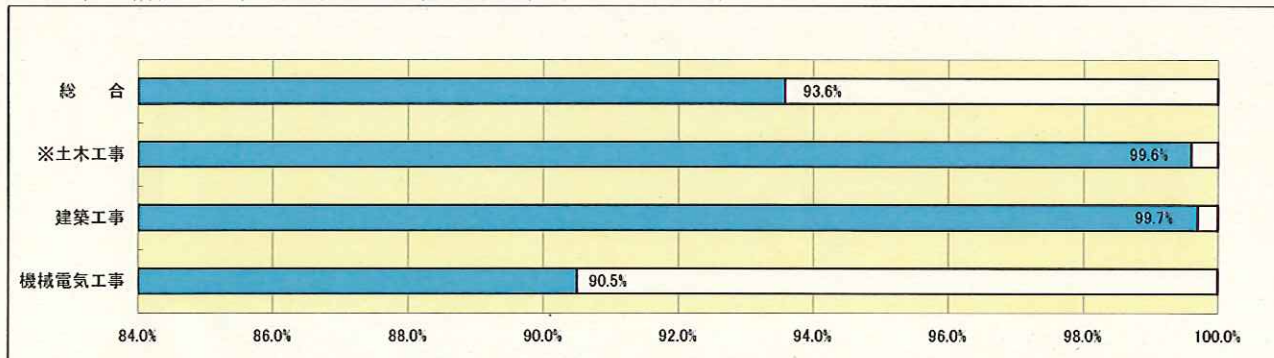

※ 土木工事は、準備工事(既設関係工事を除く)と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

## 5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景



敷地東側からの全景
