

# 大橋川改修工事状況(令和4年8月1日現在)

**上追子川排水機場(令和3年9月完成)**



排水総能力 10.4m<sup>3</sup>/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。  
排水機場の能力は、従来の5.4m<sup>3</sup>/sから、更に5.0m<sup>3</sup>/s増強されました。

**東本町地区 左岸上流部地盤改良外工事**




【工事内容】地盤改良工・浚渫工 他  
【進捗状況】浚渫前の磁気探査(進捗率約70%)を行っています。

**松崎島地区 松崎島地区第2工事用道路工事**



【工事内容】道路土工・地盤改良工・舗装工・仮橋工 他  
【進捗状況】仮橋の支持杭(H鋼)を打ち込むため、支持層まで先行して掘削を行っています。

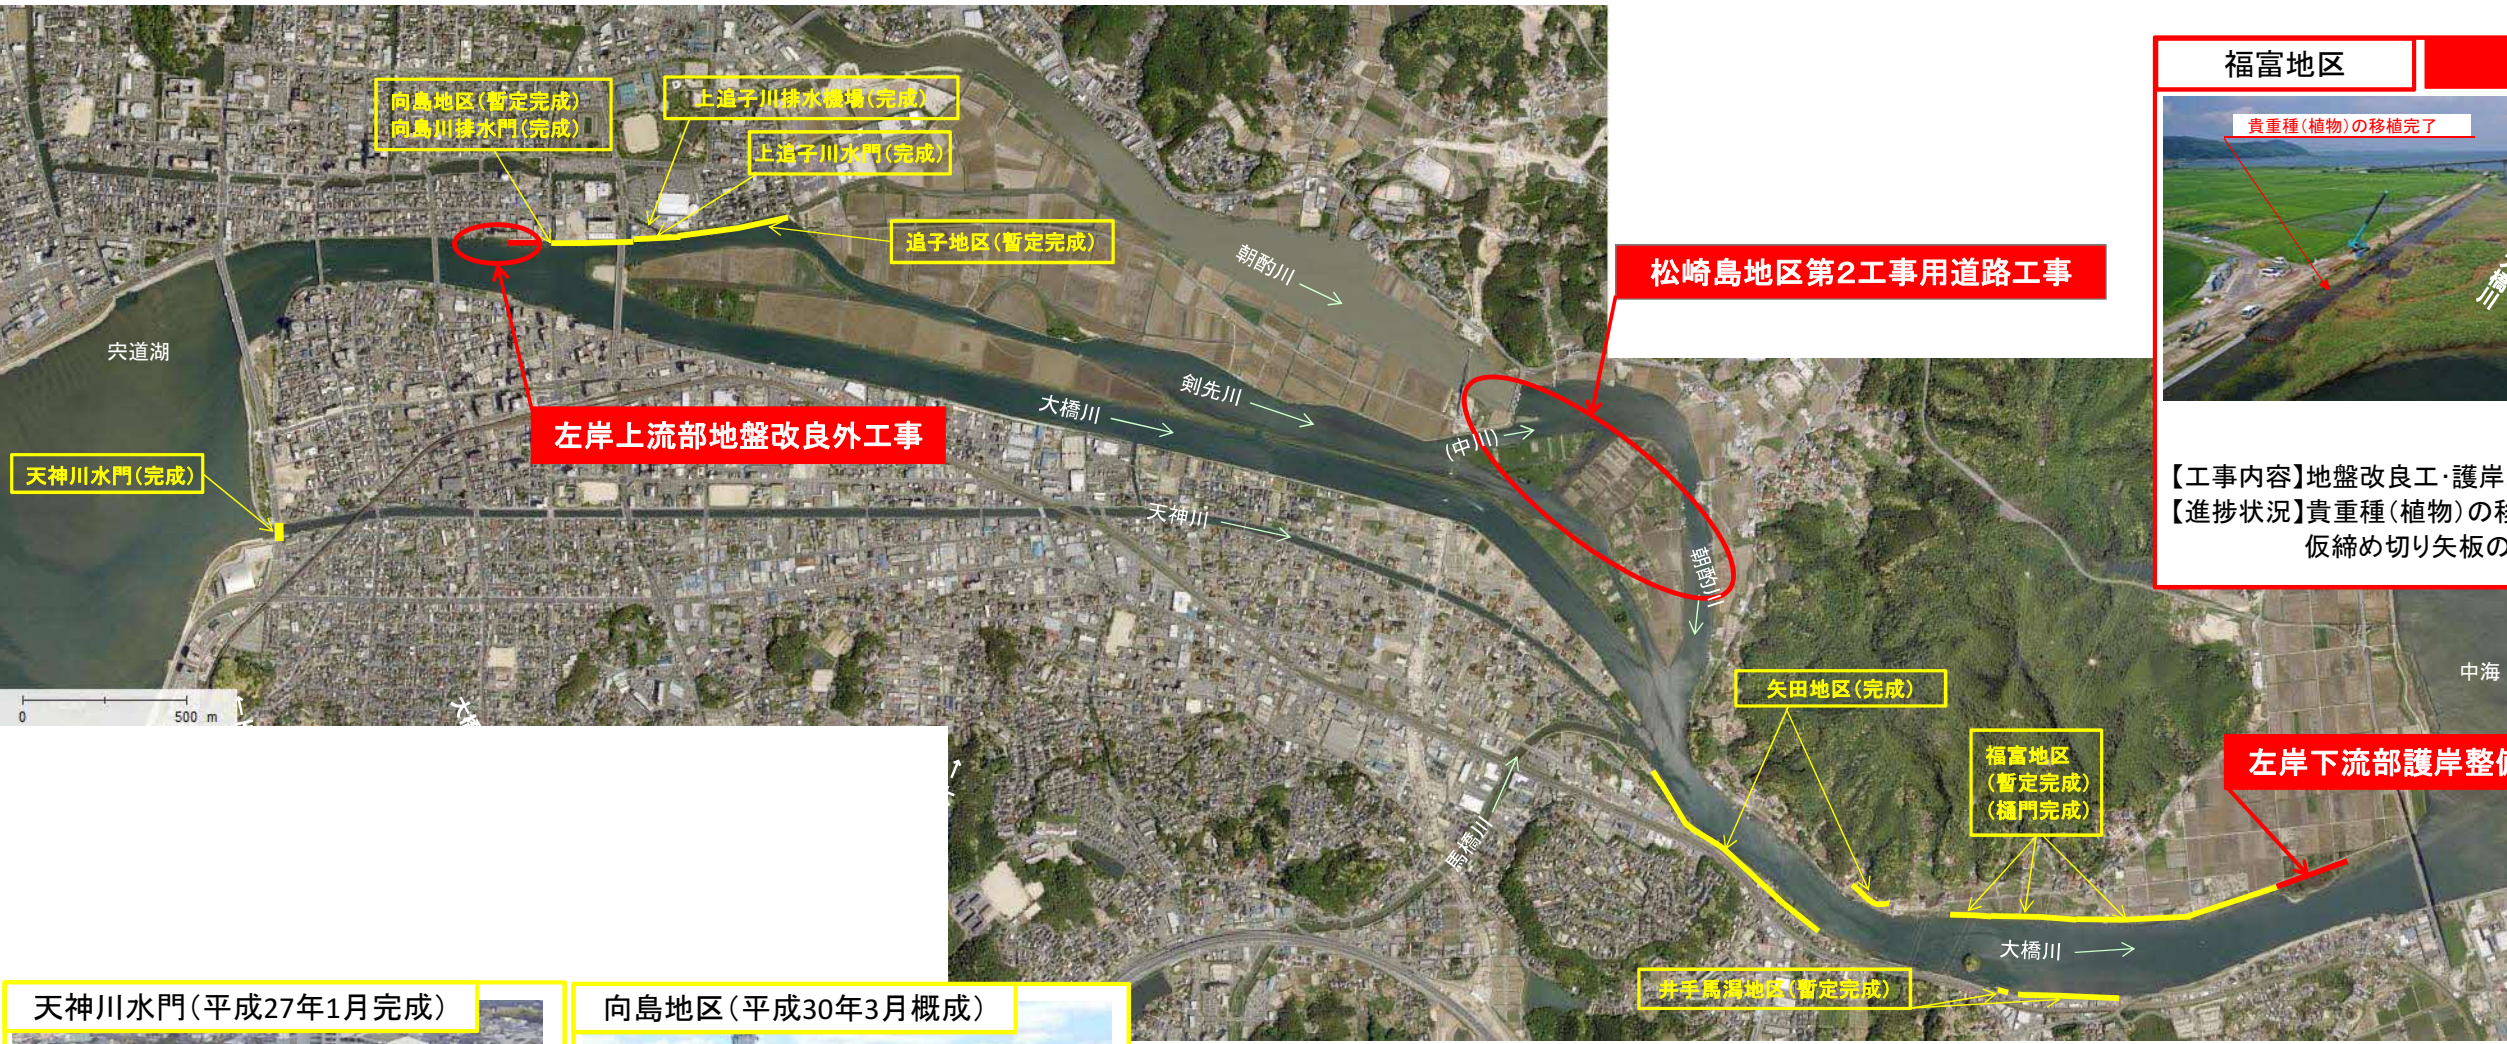

**福富地区 左岸下流部護岸整備外工事**



【工事内容】地盤改良工・護岸工・根固め工 他  
【進捗状況】貴重種(植物)の移植が完了し、護岸施工のため仮締め切り矢板の打設を行っています。

**天神川水門(平成27年1月完成)**



宍道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

**向島地区(平成30年3月概成)**



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。
