

新大橋・鍛冶橋だより Vol.12

発行：島根県松江県土整備事務所 土木工務第一部 土木工務第二課

鍛冶橋工区

topics

現在の鍛冶橋工区の状況

鍛冶橋工区では、令和7年3月に下部工（橋台）工事が完了した後、橋台前面の護岸工事、仮設構造物撤去工事を進めてきました。

あわせて、現地状況を踏まえ、施工計画や工程の見直しを行ったことにより、工事期間を延長しております。

鍛冶橋工区 第一期施工（下流側の架け替え工事）の工程

下部工工事

護岸工事

仮設構造物
撤去工事


上部工工事

凡例 ■ 実施・完了 ■ 今後の予定



令和8年11月
着手予定

第3期上部工工事 現場施工に着手します

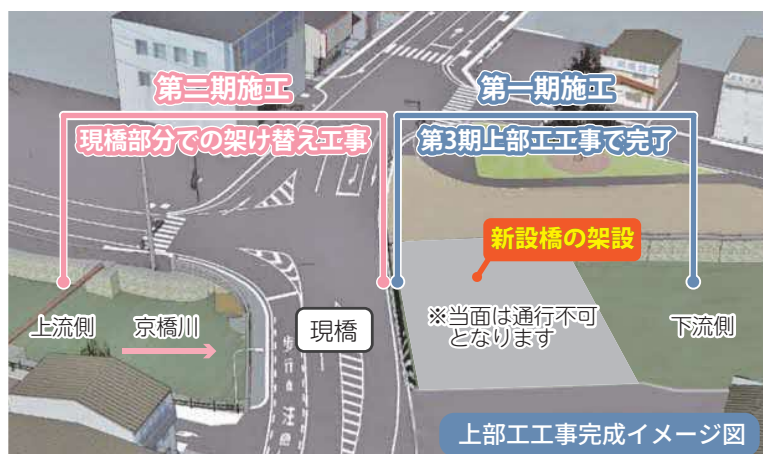

このたび、施工に向けた準備が整ったことから、令和8年11月頃から上部工工事の現場施工に着手します。上部工工事の現場施工は、株式会社藤原鐵工所が行います。

工事では、下流側に新設橋を架設します。この工事をもって、下流側で進めてきた鍛冶橋の架け替え工事（第一期施工）が完了します。

その後、現在通行している橋の架け替え工事（第二期施工）に着手するため、工事の支障となる設備などの移転工事を進めます。

鍛冶橋工区 今後の事業スケジュール

	R8 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	2月	3月
鍛冶橋工事	第3期上部工工事 施工計画・各種調整					現場施工				
説明会					● 住民説明会					

※スケジュールは予定であり、今後変更となる場合があります。

新大橋工区

令和8年9月
着手予定新大橋南詰で市道を北側へ切り替える
工事に着手します


新大橋南詰では、第1期・第2期の地盤改良工事が完了しました。

今後、現道（市道松江港線）の地盤改良工事を行うため、市道を一時的に北側へ切り替える必要があります。

このため、令和8年9月から、市道を北側へ切り替えるための工事に着手する予定です。

工事のスケジュールや施工方法などの詳細については、現在検討を進めています。

工事場所位置図

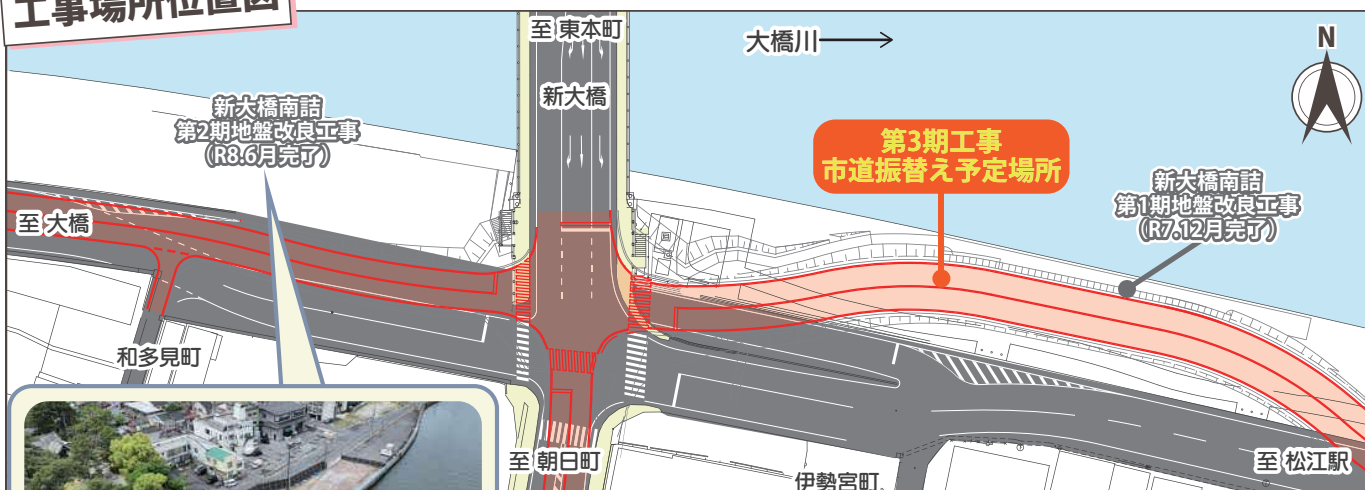

第2期地盤改良工事(和多見町側)が完了しました

和多見町側で進めていた第2期地盤改良工事が、令和8年6月に完了しました。

東本町4丁目で埋蔵文化財の本調査を行っています

東本町4丁目では、試掘調査で埋蔵文化財が確認されたことから、令和8年5月から松江市が本調査を実施しています。

現地での調査は令和8年12月末までを予定しています。

今回の調査結果を踏まえ、松江市と島根県で埋蔵文化財の取扱い方針を決定する予定です。

新大橋工区 今後の事業スケジュール

	R8 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	2月	3月
新大橋工事	第2期地盤改良工事			第3期市道振替え工事						
説明会				●						
関連事業	東本町4丁目 埋蔵文化財本調査							※スケジュールは予定であり、今後変更となる場合があります。		

工事の進捗やこれまでの情報は、島根県松江県土整備事務所のホームページ「新大橋・鍛冶橋架け替え等について」に掲載しています。

お問い合わせ先

島根県松江県土整備事務所 土木工務第一部 土木工務第二課 ☎0852-32-5729
松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課 ☎0852-55-5385

