

事業期間の延長について

出雲市駅前矢尾線（3工区）街路事業にご理解・ご協力頂きありがとうございます。

本事業区間は、平成 27 年度の完了を目標として進めて参りましたが、交通量が多く長期間の交通規制が困難であること、また、ライフラインの移設工事等と工程の調整を行いながら、順々に工事を行わなければならないこと等から、想定より工事に時間を要しています。

現在、平成 27 年度中の完了は困難な状況であることから、工程を見直し、今後は平成 29 年度中の完了を目標として工事を進めて参ります。

長期間に渡り工事中の騒音・振動等ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

平成27年度の工事予定について

平成 27 年度は、主に右図の赤枠区間の工事を行います。

【施工業者】

電線共同溝工事（～H28.3月予定）：（株）中筋組

舗装工事（～H27.12月予定）：まるなか建設（株）

（詳細は裏面をご覧ください）

※ この他、上水道、下水道、ガス、電気・通信の工事も併せて行う予定です。

現在の状況


2年前と比べ、ここまで工事が進みました



H25.5月撮影



H27.6月撮影

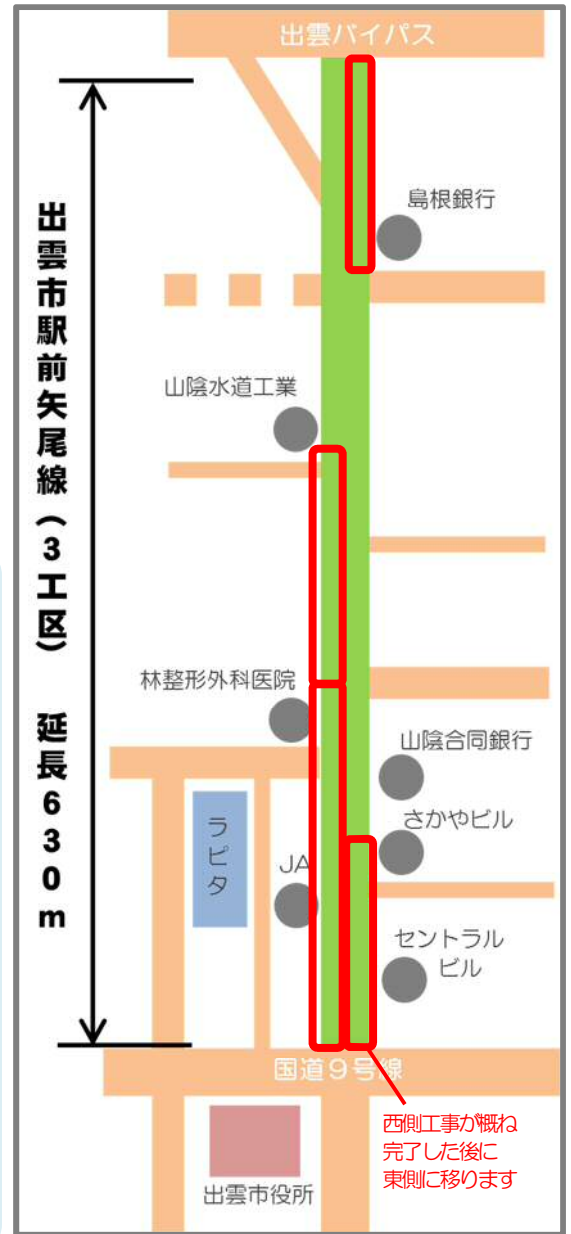

主な工事箇所



電線共同溝工事、歩道、車道の舗装工事を行います
西側の工事が概ね完了した後、車線を変更し、東側の工事に移ります



電線共同溝工事、歩道、車道の舗装工事を行います



電線共同溝工事を行います

※工事に伴い、大規模な交通規制が生じる場合は、現地予告看板等によりお知らせいたします。



工事についてお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

施工業者： (株) 中筋組 担当：板谷 TEL22-8111

まるなか建設(株) 担当：高本 TEL22-1316

発注者：出雲県土整備事務所 都市整備課 担当：足立 TEL30-5666
