



右岸ほぼ完成。工事進捗率は約75%です。 神戸川八幡原地区河川災害関連事業

平成19年10月25日現在、右岸築堤は一部法面保護工を残しほぼ完成しました。
進捗の状況は下図のとおりです。

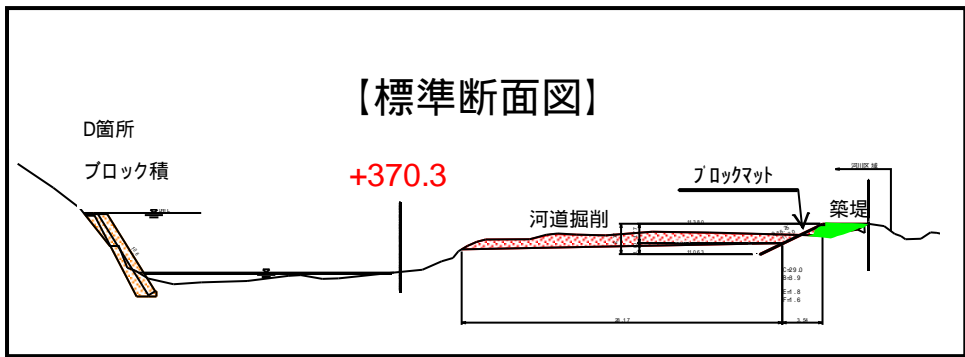

【工期延期のお知らせ】
 D箇所は水衝部の施工となるため、施工上の安全を考慮し河床掘削完成後の湯水時期の施工に変更しました。
 このため工事完成が平成20年2月となる見込みです。
 工期が延長となり、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力お願い致します。

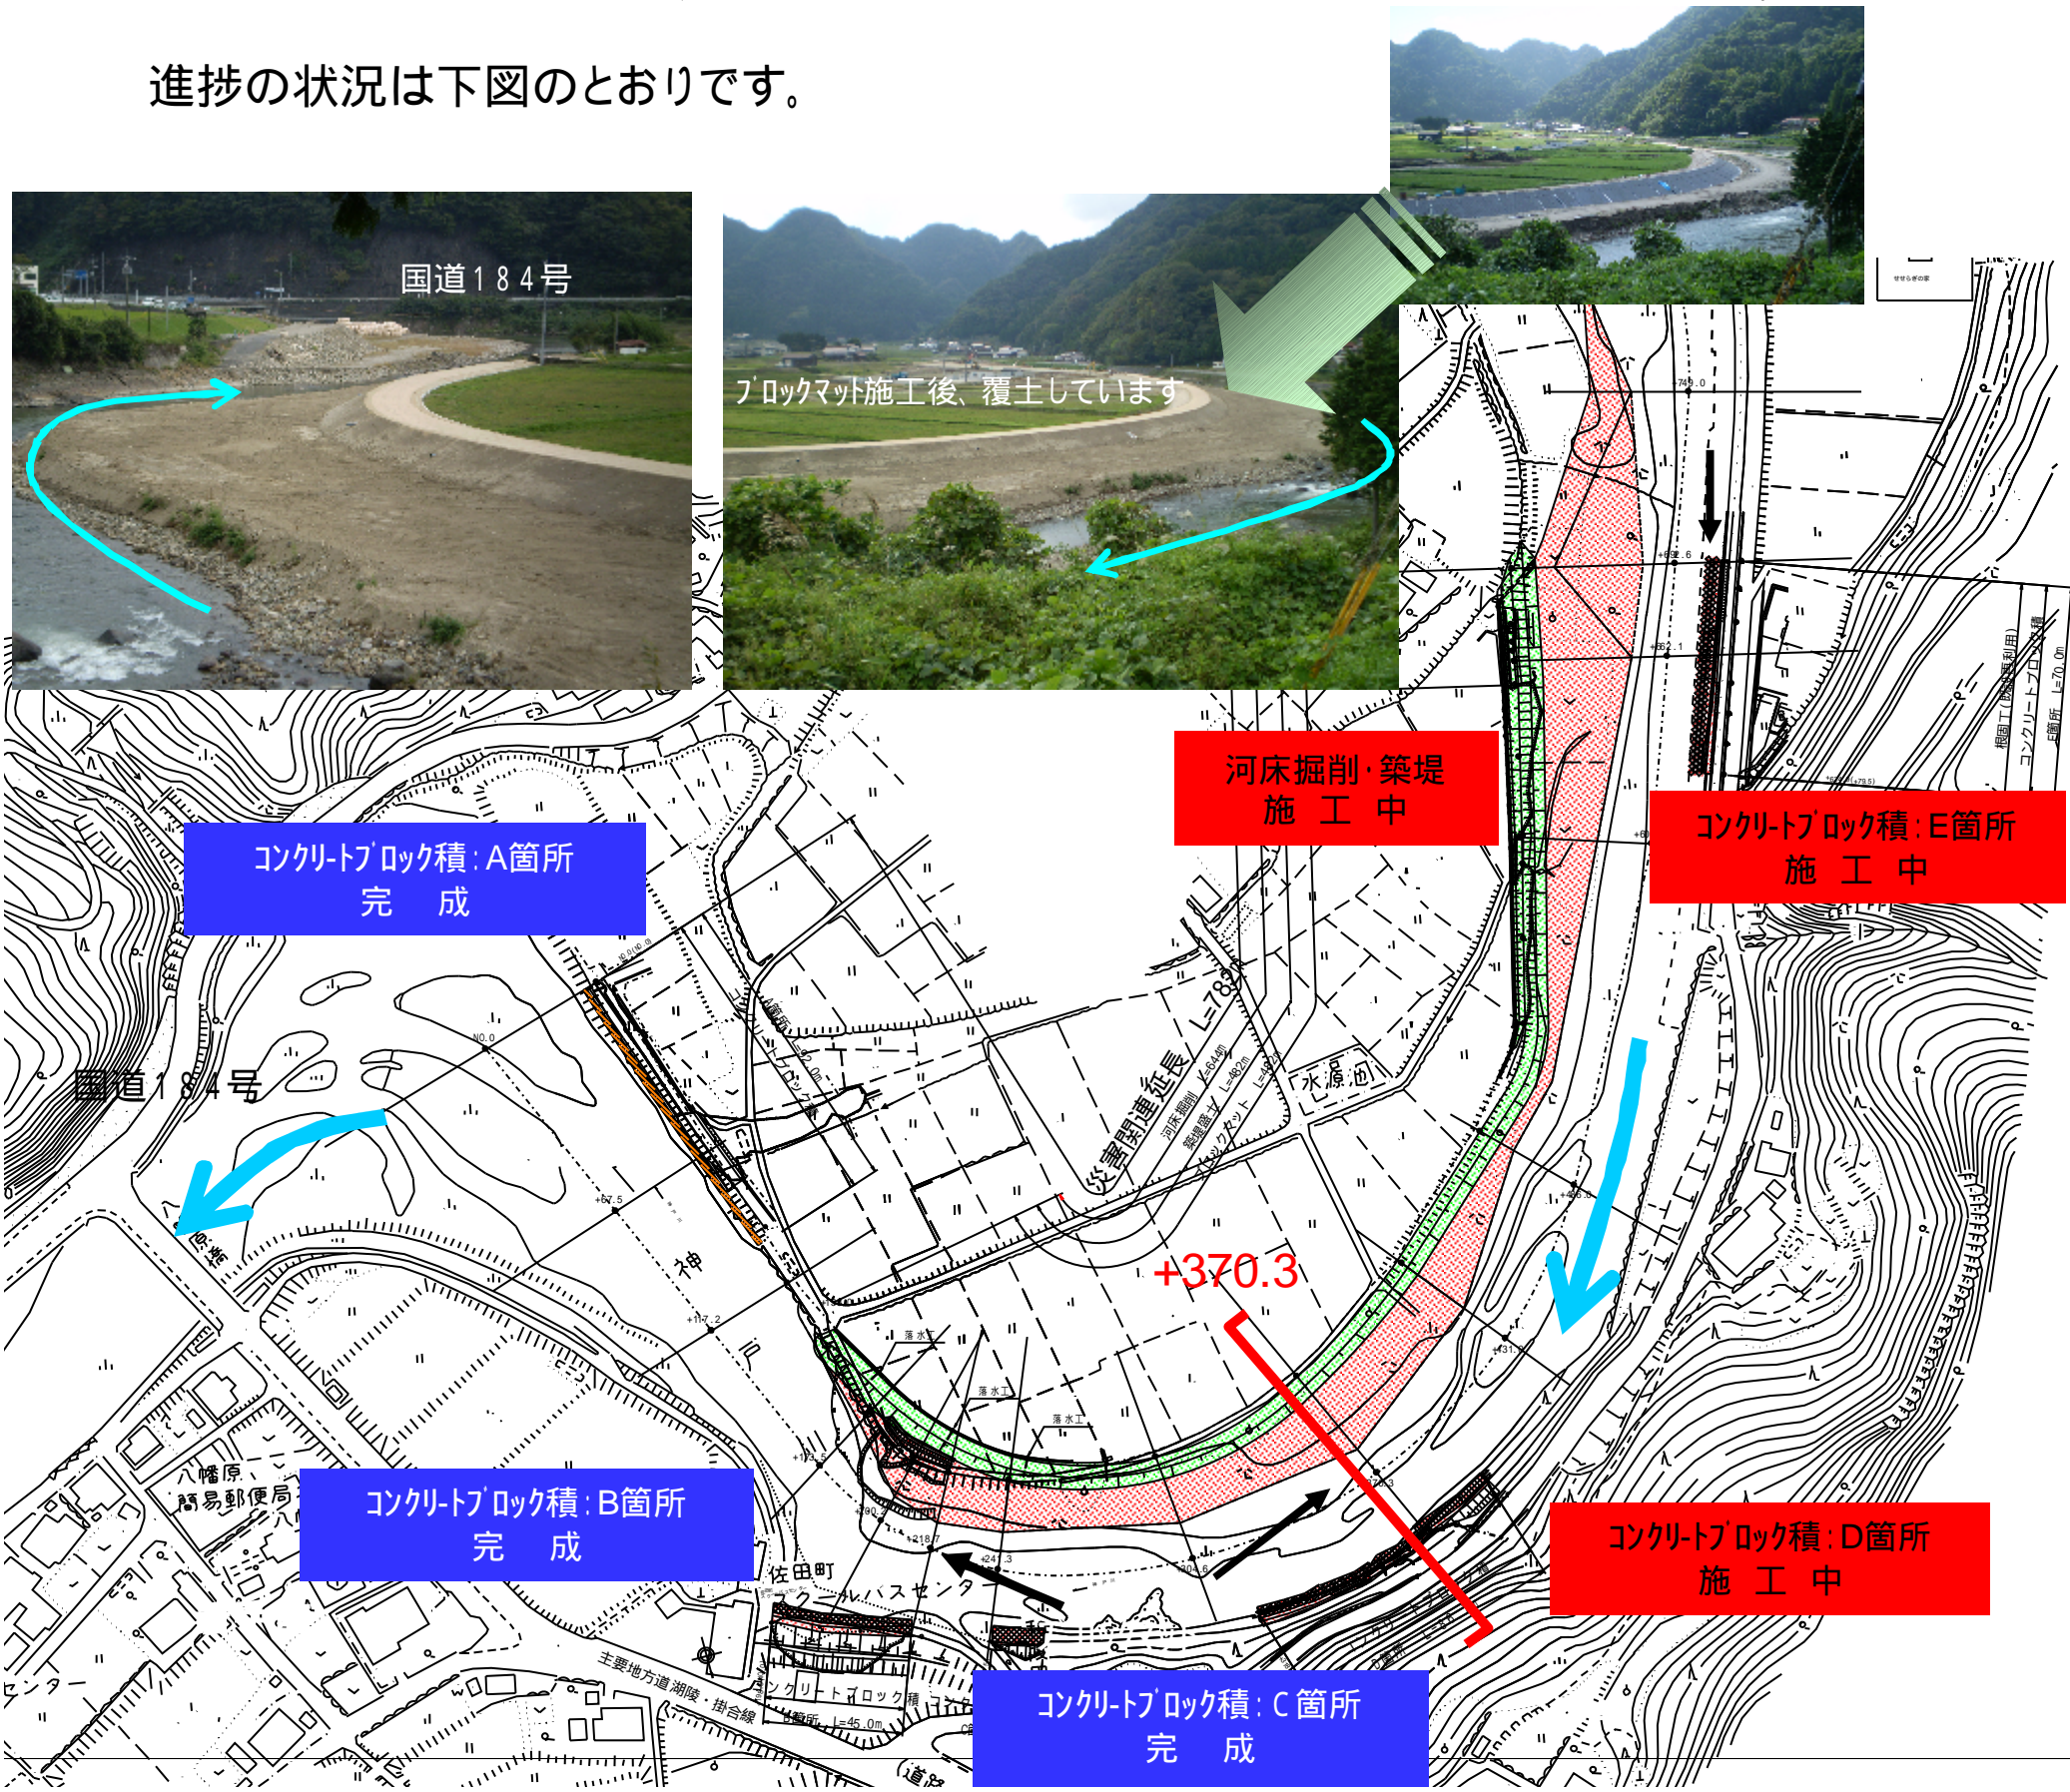
