

大社漁港海岸の工事 かわら版

6号

令和4年4月

第1工区の完成が近づきました！

大社漁港海岸 農山漁村地域整備交付金（海岸環境）事業については、飛砂・高潮対策を目的として進めており、第1工区の令和4年度完成が近づいてきました。現在の進捗状況や今後の予定、完成後の駐車場規模など、地元のみなさまにお知らせいたします。

また、第2工区についても現在設計中です。今後は地元のみなさまのご意見ご要望を伺い、設計に反映させ、自然を活かしながら飛砂・高潮対策について事業を進めていく予定です。

◆ 工事の進み具合(令和4年3月末現在)

てっぺいせき

第1工区の護岸ブロックの据付が完了しました。弁天島前の護岸は景観を考え、ブロック表面に鉄平石を貼り付けています。今後、令和4年度に駐車場側の植栽工を行い、飛砂防止対策を実施して行きます。



現在の弁天島前(令和4年3月)



完成イメージ図

◆ 工事区間の立ち入り禁止を一部解除しました！


護岸工事中、海岸線の一部を立入禁止にしていたましたが、護岸工事の完成により、右写真のとおり工事規制区間を縮小します。今後、海岸線を歩いて弁天島まで行くことが可能となります。また、護岸に座って夕日を眺めることも出来ます。



◆ 令和4年度の工事内容

第1工区の完成に向けて、最後の工事を行います。植栽工事や駐車場の舗装工事を中心に、ベンチや案内板などの公園施設も設置し、令和5年春の竣工を目指していきます。

令和4年度												
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	水叩工事											
			公園工事(電気・給水・植栽)									
				自転車道舗装工事								
					駐車場北側工事					駐車場南側工事		

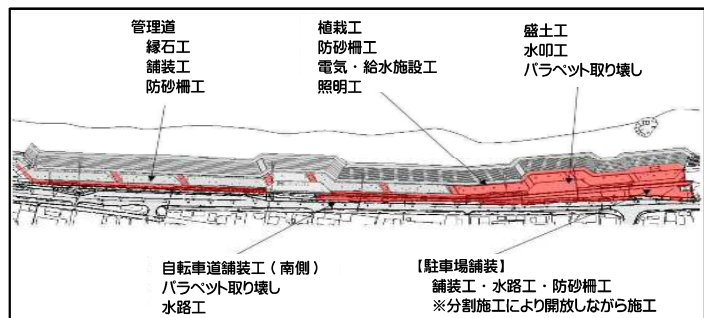

◆ 令和4年度工事（駐車場拡張）完成後稲佐の浜第1駐車場の駐車可能台数は？



凡 例	
整備前	普通車枠 83台
整備後	普通車枠 83台
	思いやり枠 2台
	合計85台

稲佐の浜第1駐車場の拡張により、現在25台の駐車枠が**85台**に増加します！（思いやり枠2台含む）これにより交通渋滞が緩和され、交通事故等からの住民の安全が確保されます。出入口の幅は、幅を現在の5mから10mに広げます。工事はこれまでの駐車場を南北に分けて行い、半分を仮設駐車場として利用しながら工事を行います。

工事完了後、現在の出入口が逆になりますので、ご注意ください。

◆ 大型バス臨時停車帯の仮設置について（令和4年度工事による渋滞対策）

令和4年度の稲佐の浜第1駐車場の工事に伴い、工事期間中に周辺道路の渋滞が助長される可能性があります。その対策として観光シーズンに限り、大型バスの臨時駐車帯を下記のとおり仮設置し、工事期間中の渋滞対策を行います。

- ・大型バスの停車枠を4台分設置します。
- ・乗降者が弁天島まで歩いていけるルートを設定します（工事の規制状況により切替えます）。
- ・観光シーズン（GW、お盆、神迎月、年末年始）に臨時停車帯を仮設置します。



- ① 自転車道の工事着手前及び完成後
- ② ③ 自転車道の工事中により、歩道が通行できない場合

◆ 第2工区の地元説明会を開催しました。

令和4年3月12日に第2工区の地元説明会を、大社プレイスうらら館にて開催しました。

当日は地元から43名の方の出席があり、本事業について貴重なご意見をいただきました。

今後につきましても、皆様と一緒に、自然を活かしながら飛砂・高潮対策として、事業を進めてまいります。

【出席者】

神協顧問 長廻出雲市市議会議員
 神協役員及び委員（杵築北地区、西地区全町内会長）、
 大社コミュニティセンター、杵築地区自治協会、大土地
 神楽方、杵築地区土木委員会、神門通りおもてなし共同
 組合、交通安全協会、交通安全対策協議会



問い合わせ先

島根県東部農林水産振興センター水産部漁港課
 TEL：0852-32-5706 FAX：0852-32-5711 担当：早志（ハヤシ）
