

八戸川通信

第7号 令和3年1月


TOPIC

011月25日 桜江小・中学校合同駅伝大会開催

先般開催されました駅伝大会へ当協議会からも警備員配備、応援等にて参加させていただきました。小・中学生の懸命な走りを見ることが出来て嬉しく思っています。

土砂運搬に関しては先月お伝えした通り12月15日～日桜ロード冬季通行不可より、築堤に利用する土砂の搬入ルートを国道261号線から川戸の町中を通るルートに変更します。

今年もあとわずかとなりましたが、来年も引き続き八戸川関連工事へのご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。



ICT施工 (法面整形編)

八戸川5期工事の築堤盛土状況です。


現在、3Dマシンガイダンスバックホウを使用し法面整形をしています。

従来は丁張※を設置し重機から降りて確認作業をしていましたが、


人工衛星から重機位置を計算しモニターを見ながら正確な施工が出来ます。



オペレーターからの施工目線

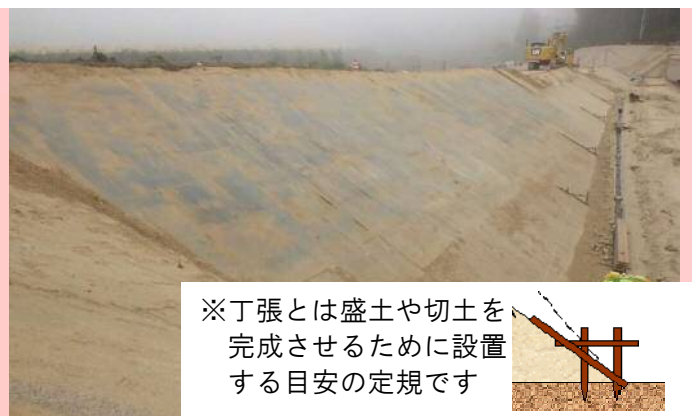


※丁張とは盛土や切土を完成させるために設置する目安の定規です



築堤の進捗状況（12月末時点）


左岸（小田圃場側）

月の夜橋 下流（進捗率：83%）




右岸（三田地側）

月の夜橋 下流（進捗率：45%）




左岸（小田圃場側）

月の夜橋 上流（進捗率：80%）




右岸（三田地側）

月の夜橋 上流（進捗率：30%）



工事箇所

5期工事において、通行止めを実施しております。
周辺住民の皆様にはご迷惑をかけますが、ご協力のほどよろしくお願いたします。（～令和3年3月末まで）

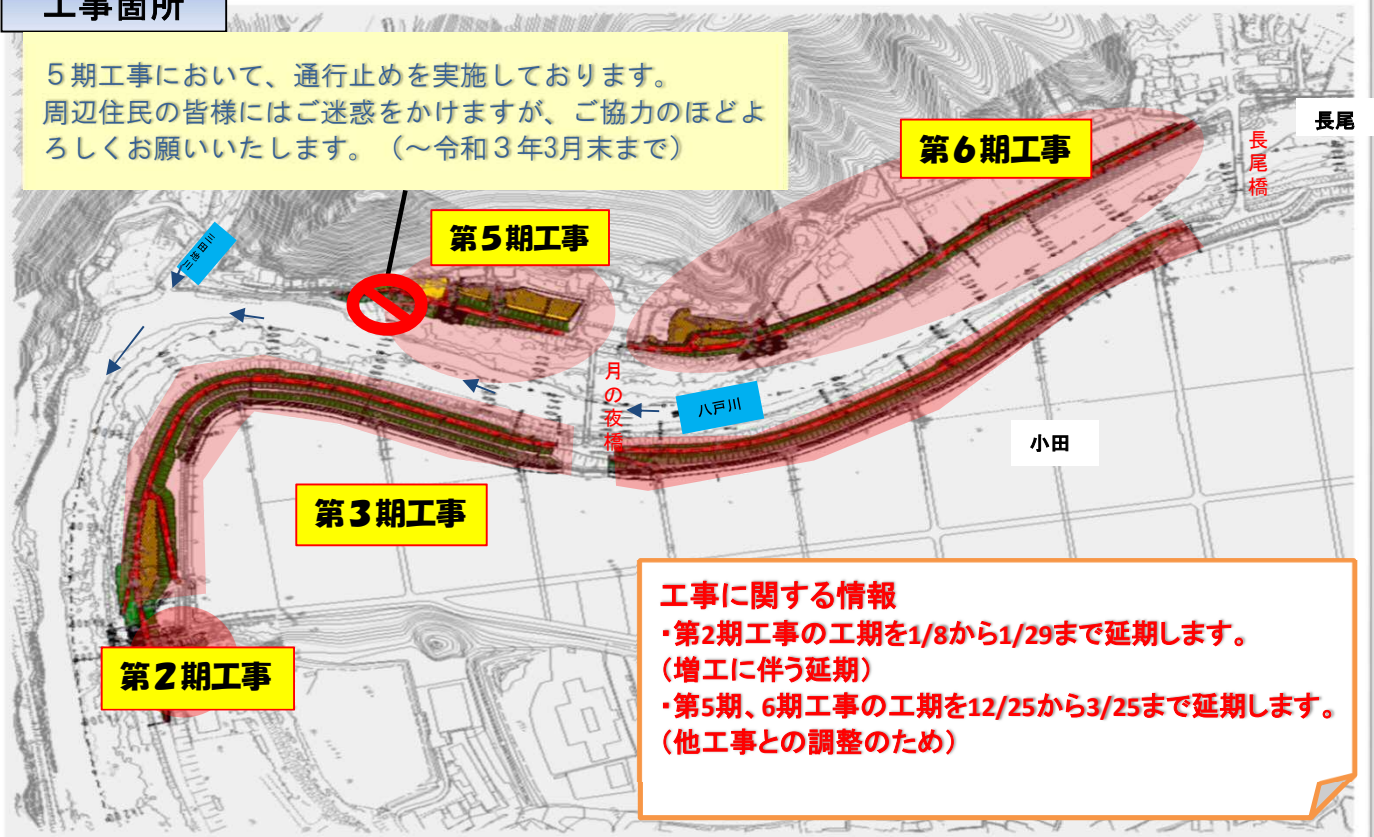

工事に関する情報

- ・第2期工事の工期を1/8から1/29まで延期します。
（増工に伴う延期）
- ・第5期、6期工事の工期を12/25から3/25まで延期します。
（他工事との調整のため）

お問い合わせ先

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課

TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

施工業者（一級河川八戸川河川災害関連事業 安全協議会）

八戸川河川災害関連事業第2期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0900

八戸川河川災害関連事業第3期工事 今井産業(株)

☎：0855-92-8140

八戸川河川災害関連事業第5期工事 (株)井上組

☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業第6期工事 (株)井上組

