


一部区間をH28秋に4車線にて 供用開始する予定です



平素より、出雲市駅前矢尾線（3工区）の街路事業にご協力いただきありがとうございます。

おかげさまで電線共同溝本体管路の工事が8月で完了の見込みとなりました。引き続き、沿線の住民様向けに各電線管理者による引き込み管路の設置工事に入ります。

車道部については、出雲バイパスから南側約300mの区間をH28秋頃に4車線にて供用を開始します。なお、4車線化後は、中央分離帯を設置するため、これまでどおりの右折ができなくなりますのでご注意ください。

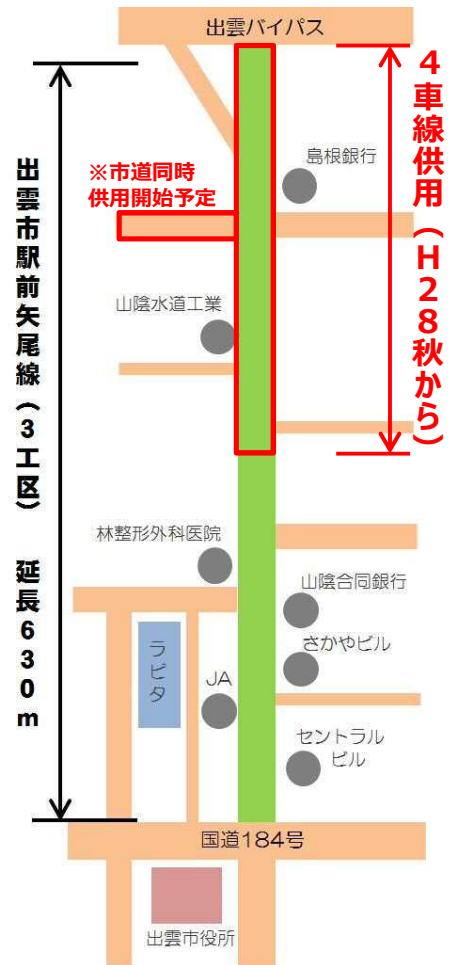

※市役所前の国道9号は、H28.4.1より島根県へ移管され、国道184号に名称が変わりました

今後のスケジュール



- 今年度10月頃より、電線共同溝へ電線・通信線の入線を順次開始します
- 入線完了後、電柱を撤去し、残りの舗装工事を行う予定です（国道184号側約330m区間）
- 平成29年度中の事業完了を目指し、関係機関と連携を図りながら工事を進めてまいります

平成28年度										平成29年度											
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電線共同溝工事																					
支障物件移設 (上下水道・ガス)																					
引き込み管委託工事 (中国電力・NTT)										電線共同溝への入線・電柱の撤去 (中国電力・NTTなど)											
照明設置工																					
舗装工事										舗装工事											

○事業についてご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください

島根県 出雲県土整備事務所 都市整備課
担当：秋月（あきづき） TEL：30-5666



いろいろとご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

