

土木部門
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=431m
工事名	安来木次線 石原工区 交通安全工事		車道舗装工	A=3890m ²
			歩道舗装工	A=1410m ²
			路面切削工	A=2400m ²
施工業者	平井建設(株)		排水構造物工	L=80m
			標識工	N=1式
			道路付属施設工	N=1式

土木部門
道路



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=313.1m
工事名	国道432号 古志原工区 改築工事 第9期		電線共同溝工	L=238.5m
			路床置換工	A=800m ³
			側溝工	L=493m
施工業者	(株)真幸土木		車道舗装工(基層、路盤)	A=1694m ²
			歩道舗装工	A=221m ²
			汚染土処理工	V=60m ³

土木部門
道路



事務所名 雲南県土整備事務所
 工事名 玉湯吾妻山線 川井大橋 橋梁耐震工事
 施工業者 (有) 細貝組

工事概要 橋長 L=51m
 落橋防止構造 N=20箇所
 水平力分担構造 N=16箇所
 RC縁端拡幅 N=4箇所
 横変位拘束構造 N=2箇所
 RC巻立て N=1箇所
 伸縮装置取替工 N=3箇所

土木部門
道路



事務所名 雲南県土整備事務所
 工事名 国道314号 川手大橋 橋梁耐震工事
 施工業者 (有) 泰中建設

工事概要 橋長 L=99m
 水平力分担構造 N=16箇所
 RC巻立て工 N=1箇所
 主桁補修工 N=1式
 支承補修工 N=1式
 伸縮装置補修工 N=2箇所
 排水装置補修工 N=1式

土木部門
道路



事務所名 出雲県土整備事務所
 工事名 矢尾今市線 大塚工区 改築工事 第27期
 施工業者 (株) ダイニ

工事概要
 工事延長 L = 955m
 車道舗装工 A = 13,036m²
 歩道舗装工 A = 3,428m²
 耐水処理舗装工 A = 2,420m²
 伸縮装置工 L = 23m (N = 2箇所)
 立入防止柵工 L = 501m
 区画線工 L = 8,129m

土木部門
道路



事務所名 出雲県土整備事務所
 工事名 斐川出雲大社線 北神立工区 改築工事 第1期
 施工業者 (株) フクダ

工事概要
 北神立橋 (橋長 L = 878m)
 工事延長 L = 900m
 防護柵工 L = 897m

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
 工事名 仁摩邑南線 川本工区 災害防除工事
 その5
 施工業者 (株) オーサン

工事概要 施工延長 L=117m
 吹付法砕工 A=942m²
 ロープ伏工 N=5箇所
 ロープ掛工 N=1箇所
 岩接着工 N=1箇所
 転石整理工 N=1式
 杭式落石防護柵工 L=18.0m
 落石防止網工 A=1351m²

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
 工事名 久利五十猛停車場線 鬼村工区 改築
 工事 第2期
 施工業者 石見銀山建設(株)

工事概要 施工延長 L=479.5m
 掘削工 V=5260m³
 盛土工 V=2110m³
 安定処理工 A=1556m²
 水路工 L=153m

土木部門
道路



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=95.0m
工事名	川本波多線 川本工区 交通安全工事		掘削工 V=480m ³
施工業者	(株)江ノ川開発		アンカー付親杭横矢板工 L=40m
			鉄筋挿入工 N=134本
			張出歩道工 L=6m
			薬液注入工 N=35本

土木部門
道路



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=395m、側溝工 L=104m
工事名	浜田八重可部線 後野工区 改築工事		下層路盤工 A=2,600m ²
	交差点第2期		上層路盤工 A=2,625m ²
施工業者	今井産業(株)		表層工 A=2,870m ²
			歩道路盤工 A=1,420m ²
			歩道表層工 A=1,420m ²
			縁石工 L=795m、防護柵工 L=384m

土木部門
道路



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	施工延長	L=121m
工事名	黒沢安城浜田線 長見工区 改築工事		掘削工	V=898m ³
			吹付砕工	L=301m
			鉄筋挿入工	N=113本
施工業者	宮田建設工業(株)		ロープ伏工	A=689m ²

土木部門
道路



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	施工延長	L=83m
工事名	国道488号 長沢バイパス 改築工事 第9期		落石防護補強土壁工	L=77m
施工業者	日新建設(株)			

土木部門
道路



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 国道191号 菊谷橋 橋梁耐震工事
施工業者 徳栄建設(株)

工事概要 工事延長(橋長) L=4.2m
RC巻立補強工 N=1基

土木部門
道路



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 益田阿武線 須子工区 改良工事 第3期
施工業者 高橋建設(株)

工事概要 橋梁下部工 工事延長 L=7.6m
張出式橋脚 N=1基
場所打ち杭 N=11本(φ1200、L=29.0m)
情報ボックス工
割込ハンドホール設置 N=2箇所
接続柵設置 N=2箇所
管路設置 L=81m

土木部門
河川



事務所名 松江県土整備事務所
 工事名 佐陀川 新武代橋A2橋台工事
 施工業者 カナツ技建工業(株)

工事概要
 工事延長 L=66m
 橋台工 N=1基
 逆T式擁壁 V=139m³
 杭基礎 N=21本
 樋門工 N=1門
 フラップゲート N=1基
 深層混合処理工 N=249本
 盤膨れ土撤去工 V=480m³
 矢板工 N=46枚

土木部門
河川



事務所名 県央県土整備事務所
 工事名 出羽川 河川改修工事 第4期
 施工業者 (有)町田土建

工事概要
 施工延長 L=260.0m
 掘削工 V=7300m³
 ブロック積工 A=846m²

土木部門
河川



事務所名 浜田県土整備事務所
工事名 八戸川 河川災害関連工事 第2期
施工業者 (株)井上組


工事概要 施工延長 L=118m
樋門 N=1基
盛土工 V=6930m³
植生工 A=950m²
排水構造物工 L=186m

土木部門
港湾空港



事務所名	隠岐支庁県土整備局	工事概要	施工延長 L=40m
工事名	西郷港 本港地区 棧橋補修工事 第7期		上部工製作・据付工 A=626m ²
			コンクリート舗装工 A=986m ²
施工業者	徳畑建設(株)		

土木部門
港湾空港

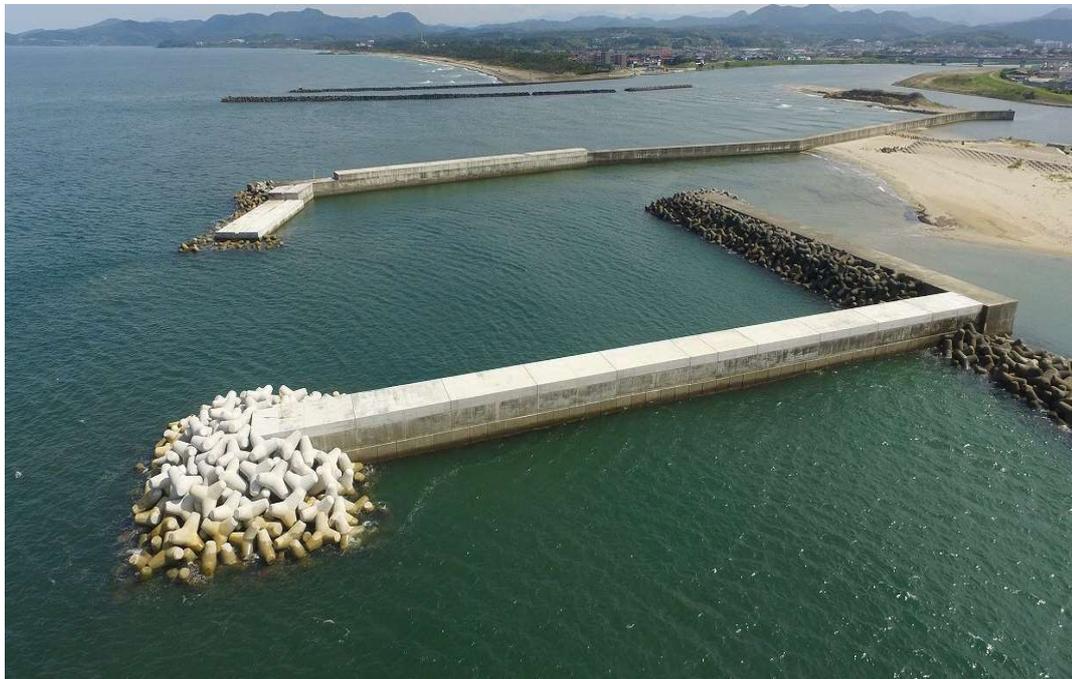

事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	防波堤(西) L=100m
工事名	益田港 港湾改修工事		捨石工 V=1010m ³
			消波ブロック製作 n=176個
			上部工 V=530m ³
施工業者	大畑建設(株)		消波ブロック据付 n=241個
			波除堤(東) L=30m
			上部工 V=367m ³

土木部門
砂防



事務所名 松江県土整備事務所
工事名 福浦地区 急傾斜地崩壊対策工事
施工業者 一畑工業（株）

工事概要 工事延長 L=49m
掘削工 V=930m³
吹付法砕工 A=368m²
植生工 A=70m²
鉄筋挿入工 N=25箇所
仮設防護柵 N=1式

土木部門
砂防



事務所名 益田県土整備事務所
工事名 牧ノ谷川 砂防工事 第4期
施工業者 堀建設（株）

工事概要 工事延長 L=59m
ブロック積工 A=134m²
床固工 N=2基 (Con=268m³)

土木部門
砂防



事務所名 隠岐支庁県土整備局
工事名 岩崎の谷川 砂防工事 第3期
施工業者 (株)竹田組

工事概要 流木捕捉工 V=384m³
取付護岸工 L=47m、A=214m²
側壁・水叩き工 V=112m³

土木部門
都市計画



事務所名 松江県土整備事務所
 工事名 揖屋馬潟線 街路工事 第7期
 施工業者 (株) トウケン

工事概要 施工延長 L=84m
 樋門本体工 N=1基
 地盤改良工 N=217本
 護岸工 L=36m
 仮設護岸工 L=49m

土木部門
都市計画

起点部



中間部



終点部



事務所名 宍道湖流域下水道事務所
 工事名 宍道湖流域下水道 西部処理区 管更生工事
 施工業者 (株) 中筋組

工事概要 工事延長 L=284m
 管更生工 L=284m
