


土木部門
道路

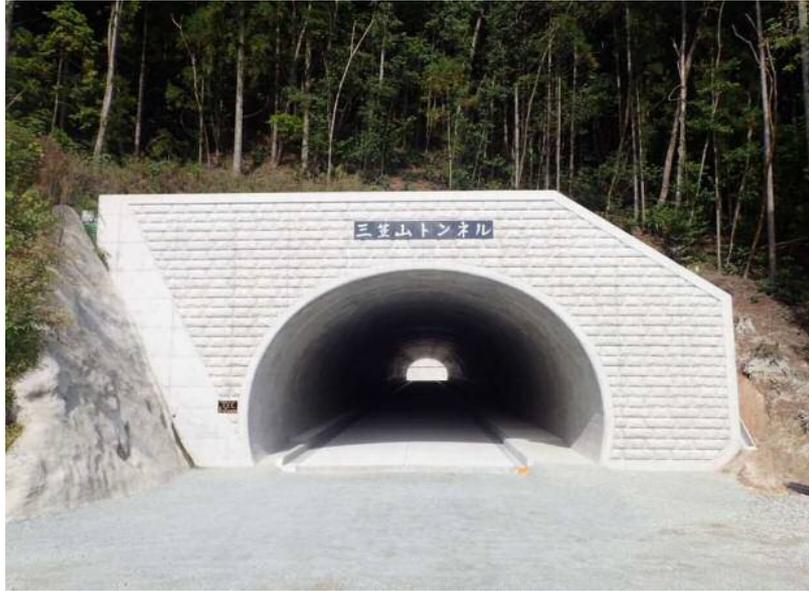

事務所名 松江市土整備事務所
 工事名 国道432号 菅原広瀬バイパス (2工区)
 道路改築工事 (仮称) 広瀬トンネル
 施工業者 中筋組・豊洋特別共同企業体

工事概要 工事延長 215m(うちトンネル延長164m)
 内空断面 54.3m²
 幅員 9.75m(0.75+0.5+3.002+0.5+2.00)
 掘削工法 NATM(機械掘削)

土木部門
道路



事務所名 松江市土整備事務所
 工事名 国道432号 古志原工区
 交通安全工事 第2期
 施工業者 (株) 真幸土木

工事概要 施工延長 L=173.4m
 掘削工 V=1,400m³
 函渠工 L=116.7m
 側溝工 L=152.0m
 縁石工 L=147.6m
 電線共同溝 L=147.6m
 ブロック積工 A=239m²
 舗装工 A=821m²

土木部門
道路



事務所名 松江県土整備事務所
工事名 松江島根線 くにびき大橋
橋梁耐震工事 P3
施工業者 カナツ技建工業（株）

工事概要 補強鋼板等製作 26.0 t
RC橋脚補強工（鋼板巻き立て） 1橋脚

土木部門
道路



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 上久野大東線 金成工区
道路改築工事 第2期
施工業者 （株）植田建設

工事概要 工事延長 L=220m
盛土工 V=880m³
購入土 V=660m³
ブロック積工 A=184m²
側溝工 L=295m
下層路盤工 A=1,550m²

土木部門
道路



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 奥出雲高野線 小馬木工区
道路改築工事
施工業者 (有) 蔦川土木

工事概要
工事延長 L=149.7m
土工 V=890m³
擁壁工(垂直壁) A=453.5m²
水路工 L=113m
舗装工 A=926m²
防護柵工 L=146m

土木部門
道路



事務所名 出雲県土整備事務所
工事名 斐川上島線 武部2工区
道路改築工事 第2期
施工業者 (株) フクダ

工事概要
施工延長 L=50m
T型橋脚 N=1基、逆T式橋台 N=1基、
補強土壁工 A=113m²、仮設工 N=1式

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 浜田作木線 戸河内工区
災害防除工事
施工業者 (株) オーサン

工事概要 工事延長 L=165m
高エネルギー吸収式落石防止網工
A=1,155m²
既設落石防止網補強工 A=1,733m²
予防工 A=83m²

土木部門
道路



事務所名 県央県土整備事務所
工事名 市木井原線 於保知大橋
橋梁耐震工事
施工業者 (株) 溝辺組

工事概要 橋梁上部工耐震補強工
(炭素繊維接着工法)
A=1,472m²

土木部門
道路



事務所名	県央県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=188m
工事名	田所国府線 市木工区 道路改築工事		コンクリートブロック積 A=1,039m ²
施工業者	(有) 福井建設		排水工 L=51m
			防護柵基礎工 L=147m
			橋梁工 橋長L=9.0m 幅員W=1.7 (2.0) m
			コンクリートブロック積 A=37m ²
			水路工 L=40m

土木部門
道路



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	トンネル名称：(仮称)市山トンネル
工事名	桜江金城線 市山区 道路改築工事 (仮称)市山トンネル		工事延長：835m (うちトンネル延長823m)
施工業者	今井産業・原工務所・日新建設 特別共同企業体		幅員：8m (0.75+0.5+2.75 × 2+0.5+0.75)
			内空断面積：44.1m ²
			掘削工法：NATM (発破掘削)

土木部門
道路



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=290m
工事名	田所国府線 大金工区 道路改築 舗装工事 第2期		下層路盤工 A=1,890㎡ 上層路盤工 A=1,890㎡ 表層工 A=2,160㎡ 耐水処理 A=1,330㎡ 区画線工 L=940m
施工業者	今井産業(株)		

土木部門
道路



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=100.0m
工事名	国道488号 落合工区 道路改築工事		掘削工 V=1,630m ³ 大型ブロック積擁壁工 A=410.7m ² 排水構造物工 L=52m 現場吹付法砕工 A=1,082m ² 鉄筋挿入工 N=127本
施工業者	前田建設(有)		

土木部門
道路



事務所名 隠岐県土整備局
工事名 西郷布施線 大久2工区
道路改築工事
施工業者 (株)竹田組

工事概要 施工延長 L=132m
軽量盛土工 V=930m³
コンクリート床版工 V=119m³
排水構造物工 L=170m
防護柵設置工 L=80m

土木部門
河川



事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=451.4m
工事名	赤川 河川緊急整備工事 白枝新大橋舗装工		舗装工 (車道部)	A=6651m ²
			舗装工 (歩道部)	A=3085m ²
施工業者	(株) ダイニ		区画線工	L=3236m
			橋面防水工	A=883m ²

土木部門
河川



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	施工延長	L=333.3m
工事名	津和野川 河川災害復旧助成 津和野川工区 第7期工事		石積工	A=1,782m ²
			石積根継工	A=331m ² 、石張工 A=224m ²
施工業者	(株) 野村組		コンクリートブロック積工	A=1,325m ²
			コンクリート平張工	A=1,229m ²

土木部門
河川




事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=250m
工事名	津和野川 河川災害復旧助成 津和野川工区 第6期工事		環境保全型ブロック積工 A=1,175m ²
施工業者	堀建設(株)		石積根継工 A=330m ²
			石張工 A=388m ²

土木部門
河川



事務所名	浜田河川総合開発事務所	工事概要	施工延長 L=44.5m
工事名	波積ダム建設事業 付替県道 その11工事		補強土壁工 N=1式
施工業者	江津土建(株)		大型水路工 L=18.6m
			カルバート工 L=25.5m

土木部門
港湾空港

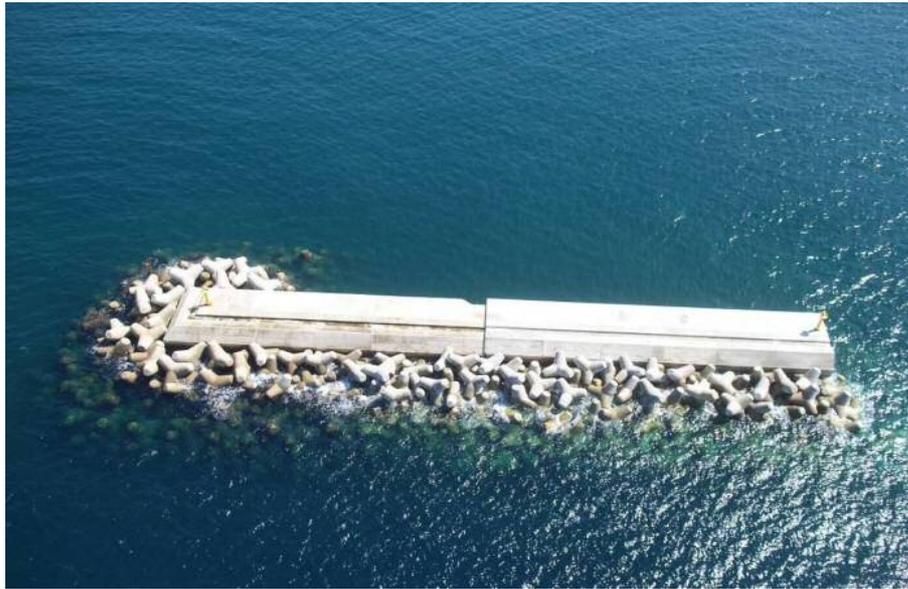

事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=67.5m
工事名	河下港 港湾改修工事 第5期		捨石均し A=2454m ²
施工業者	(株)中筋組		ケーソン据付工 N=3箇
			根固ブロック製作・据付 N=34個
			消波ブロック製作 N=43個
			上部コンクリート工 V=634m ³

土木部門
港湾空港



事務所名	隠岐支庁県土整備局	工事概要	施工延長 L=146m
工事名	西郷港 本港地区 港湾改修 東町物揚場海岸護岸工事		地盤改良工 V=2,099m ³
施工業者	徳畑建設(株)		基礎捨石工 V=3,179m ³
			調査ボーリング(海上) 1式

土木部門
砂防



事務所名 雲南県土整備事務所
工事名 寺谷3地区 急傾斜地崩壊対策
工事
施工業者 (株) 都間土建

工事概要 施工延長 L=97.0m
もたれ式擁壁 V=498m³
吹付法枠 A=1,008m²
客土吹付 A=54m²
枠内吹付 A=664m²
落石防護柵 L=102m

土木部門
砂防



事務所名 浜田県土整備事務所
工事名 古市場地区 急傾斜地崩壊対策
工事
施工業者 (株) 島根三友

工事概要 現場吹付法枠工 A=438m²
植生基材吹付工(枠内) A=275m²
鉄筋挿入工 N=32本
地山補強土工 A=196m²

土木部門
砂防



事務所名 隠岐県土整備局
工事名 荒尾地区 急傾斜地崩壊対策
工事
施工業者 (株) 金田建設

工事概要

施工延長

L=55m

もたれ式擁壁工

V=124m³

水路工

L=18m

モルタル吹付工

A=213m²

植生基材吹付工

A=92m²

法枠工

A=88m²

土木部門
都市計画



事務所名	松江県土整備事務所	工事概要	施工延長	L=451.5m
工事名	城山北公園線 2工区 街路事業 舗装工事		車道舗装工	A=8,686㎡
			歩道舗装工	A=641㎡
			水路工	L=175m
施工業者	松江土建(株)		電線共同溝工	L=18.8m

土木部門
都市計画



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	工事延長	L=302m
工事名	中島染羽線 京町・吉田東工区 街路工事 第4期		側溝工	L=602m
			ブロック舗装工	A=807㎡
			歩道境界ブロック工	L=363m
			歩道照明工	N=10基
			交差点照明工	N=4基
施工業者	中国道路(株)		ボックスカルバート工	N=1式
