平成24年7月10日
中国電力株式会社
島根原子力建設所

島根原子力発電所３号機建設工事進捗状況（平成２４年６月末現在）

1. 主要工程

（凡例　▽:計画，▼:実績）

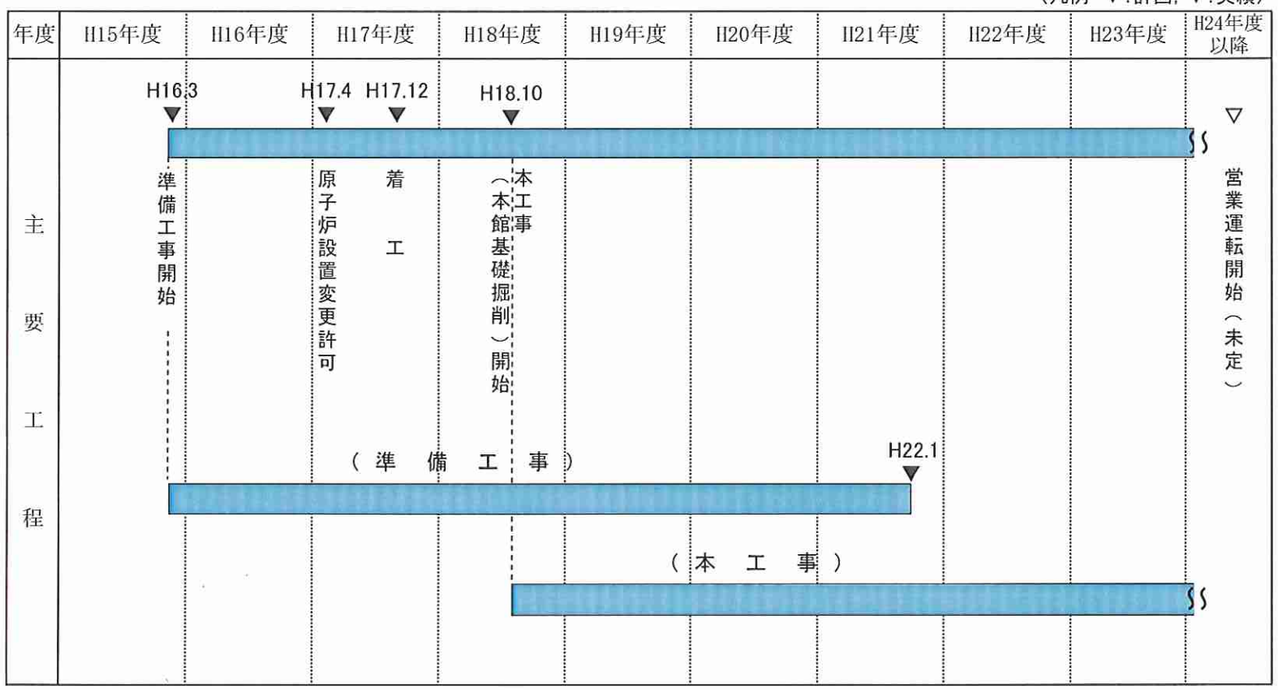

2. 許認可状況

（凡例　○:提出，●:許認可）

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可（着工）	H17. 5.31	H17.12.22
●公有水面埋立竣功許可	－	H22. 1.19	●第2回工事計画認可	H18. 2.28	H18.10. 5
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2.23	●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19. 5.22
●原子炉設置変更許可	H12.10. 4	H17. 4.26	●第4回工事計画認可	H19. 7.31	H20. 4.23
●電気工作物変更届出	H17. 5.23	－	●第5回工事計画認可	H20. 5.30	H20.12.26
●燃料設備使用承認	H22. 8. 5	H22. 8.27	●工事計画変更認可（洗濯廃液処理装置）	H21. 7.24	H21.10.14
			●工事計画変更認可（排ガス再結合器）	H21.10.15	H21.11.9
			●工事計画軽微変更届出	H24.1.5	－

3. 工事進捗率

総工事進捗率：--.-%

現在，福島第一原子力発電所の事故を踏まえた安全評価（ストレステスト）について評価・検討を実施しているところであり，建設工程が確定しないことから，進捗率については建設工程が確定した後，算出し，お知らせします。

＜参考：平成２３年４月末時点の総工事進捗率：９３．６％＞

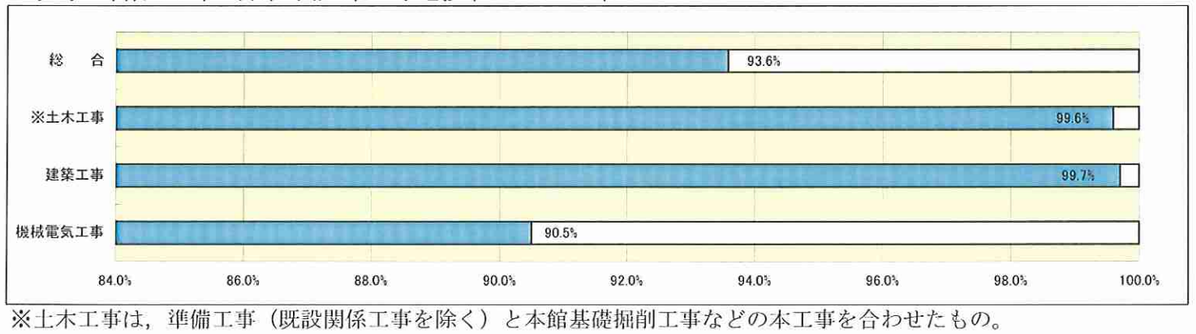

※土木工事は，準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

4. 建設工事概況

(1)土木工事

・構内整備工事
　構内道路・排水路他施工中

(2)建築工事

・本館建物内水密扉設置工事中

(3)機械電気工事

5. 建設工事状況写真

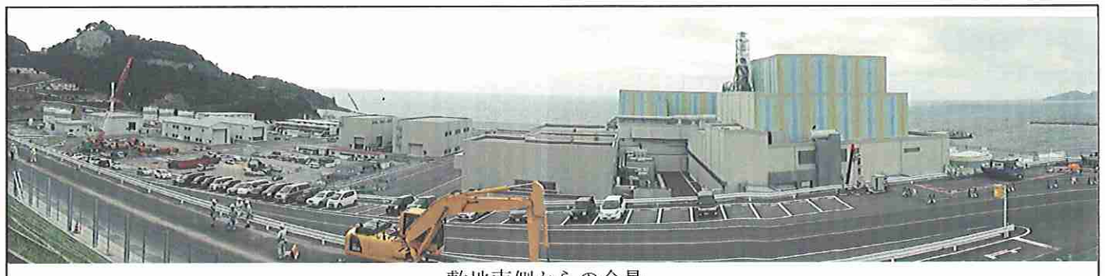

敷地南側からの全景

敷地東側からの全景
