2025年5月10日
中国電力株式会社
島根原子力発電所

島根原子力発電所３号機　建設工事の進捗状況（２０２５年５月末現在）

1. 主要工程

（凡例　▽:計画，▼:実績）

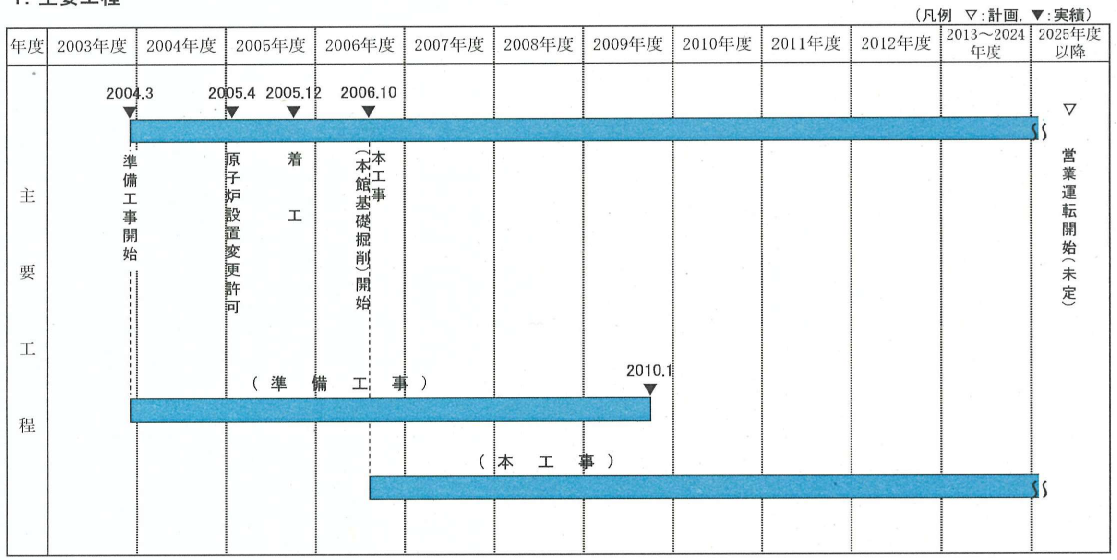

2. 許認可状況

（凡例　○:提出，●:許認可）

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	2003.11.10	2004. 2. 9	●第1回工事計画認可（着工）	2005. 5.31	2005.12.22
●公有水面埋立竣功許可	－	2010. 1.19	●第2回工事計画認可	2006. 2.28	2006.10. 5
●林地開発許可	2003. 6. 2	2004. 2.23	●第3回工事計画認可	2006.11.30	2007. 5.22
●原子炉設置変更許可	2000.10. 4	2005. 4.26	●第4回工事計画認可	2007. 7.31	2008. 4.23
●原子炉設置変更許可（新規制基準適合性審査）	2018. 8.10	未定	●第5回工事計画認可	2008. 5.30	2008.12.25
●電気工作物変更届出	2005. 5.23	－	●工事計画変更認可（洗濯廃液処理装置）	2009. 7.24	2009.10.14
●燃料設備使用承認	2010. 8. 5	2010. 8.27	●工事計画変更認可（排ガス再結合器）	2009.10.15	2009.11. 9
			●工事計画軽微変更届出	2012. 1. 5	－
			●工事計画変更認可（排気筒）	2013. 5.20	2013. 7. 1

3. 工事進捗率

総工事進捗率：－.－%

新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

4. 建設工事概況

(1)土木工事

・ﾌｨﾙﾀ付ﾍﾞﾝﾄ設備設置工事
・地下式軽油タンク格納槽他設置工事
・地下水位低下設備設置工事のうち揚水井戸他設置工事

(2)建築工事

(3)機械電気工事

・火災防護対策強化工事
・静的触媒式水素処理装置設置工事
・ガスタービン発電機の設置
・ﾌｨﾙﾀ付ﾍﾞﾝﾄ設備設置工事
・非常用ディーゼル発電設備軽油タンク設置工事
・機器・配管等の耐震補強工事

5. 建設工事状況写真

敷地東側からの全景
